

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI  
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR  
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI  
FŐOSZTÁLYA

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Poppréné Révay Gyöngyi  
Polgármester

Pilisszentiván

Szabadság út 85.  
2084

**TÁRGY:** Aláírt Támogatási szerződés  
megküldése

**Iktatószám:** EPVF/11296-2/2017-NF

**EUPR Iktatószám:** IKT-2017-106-I1-  
00009278

**ÜGYINTÉZŐ:** Simon Dóra

**Telefon:** +36-1-896-5572

**E-MAIL:** dora.simon@nfm.gov.hu

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.9-16-2016-00103** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.


Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 1 példányban megküldjük.

Kelt: Budapest, 2017. 05. 17.

Tisztelettel:

Varró Ákos István  
főosztályvezető



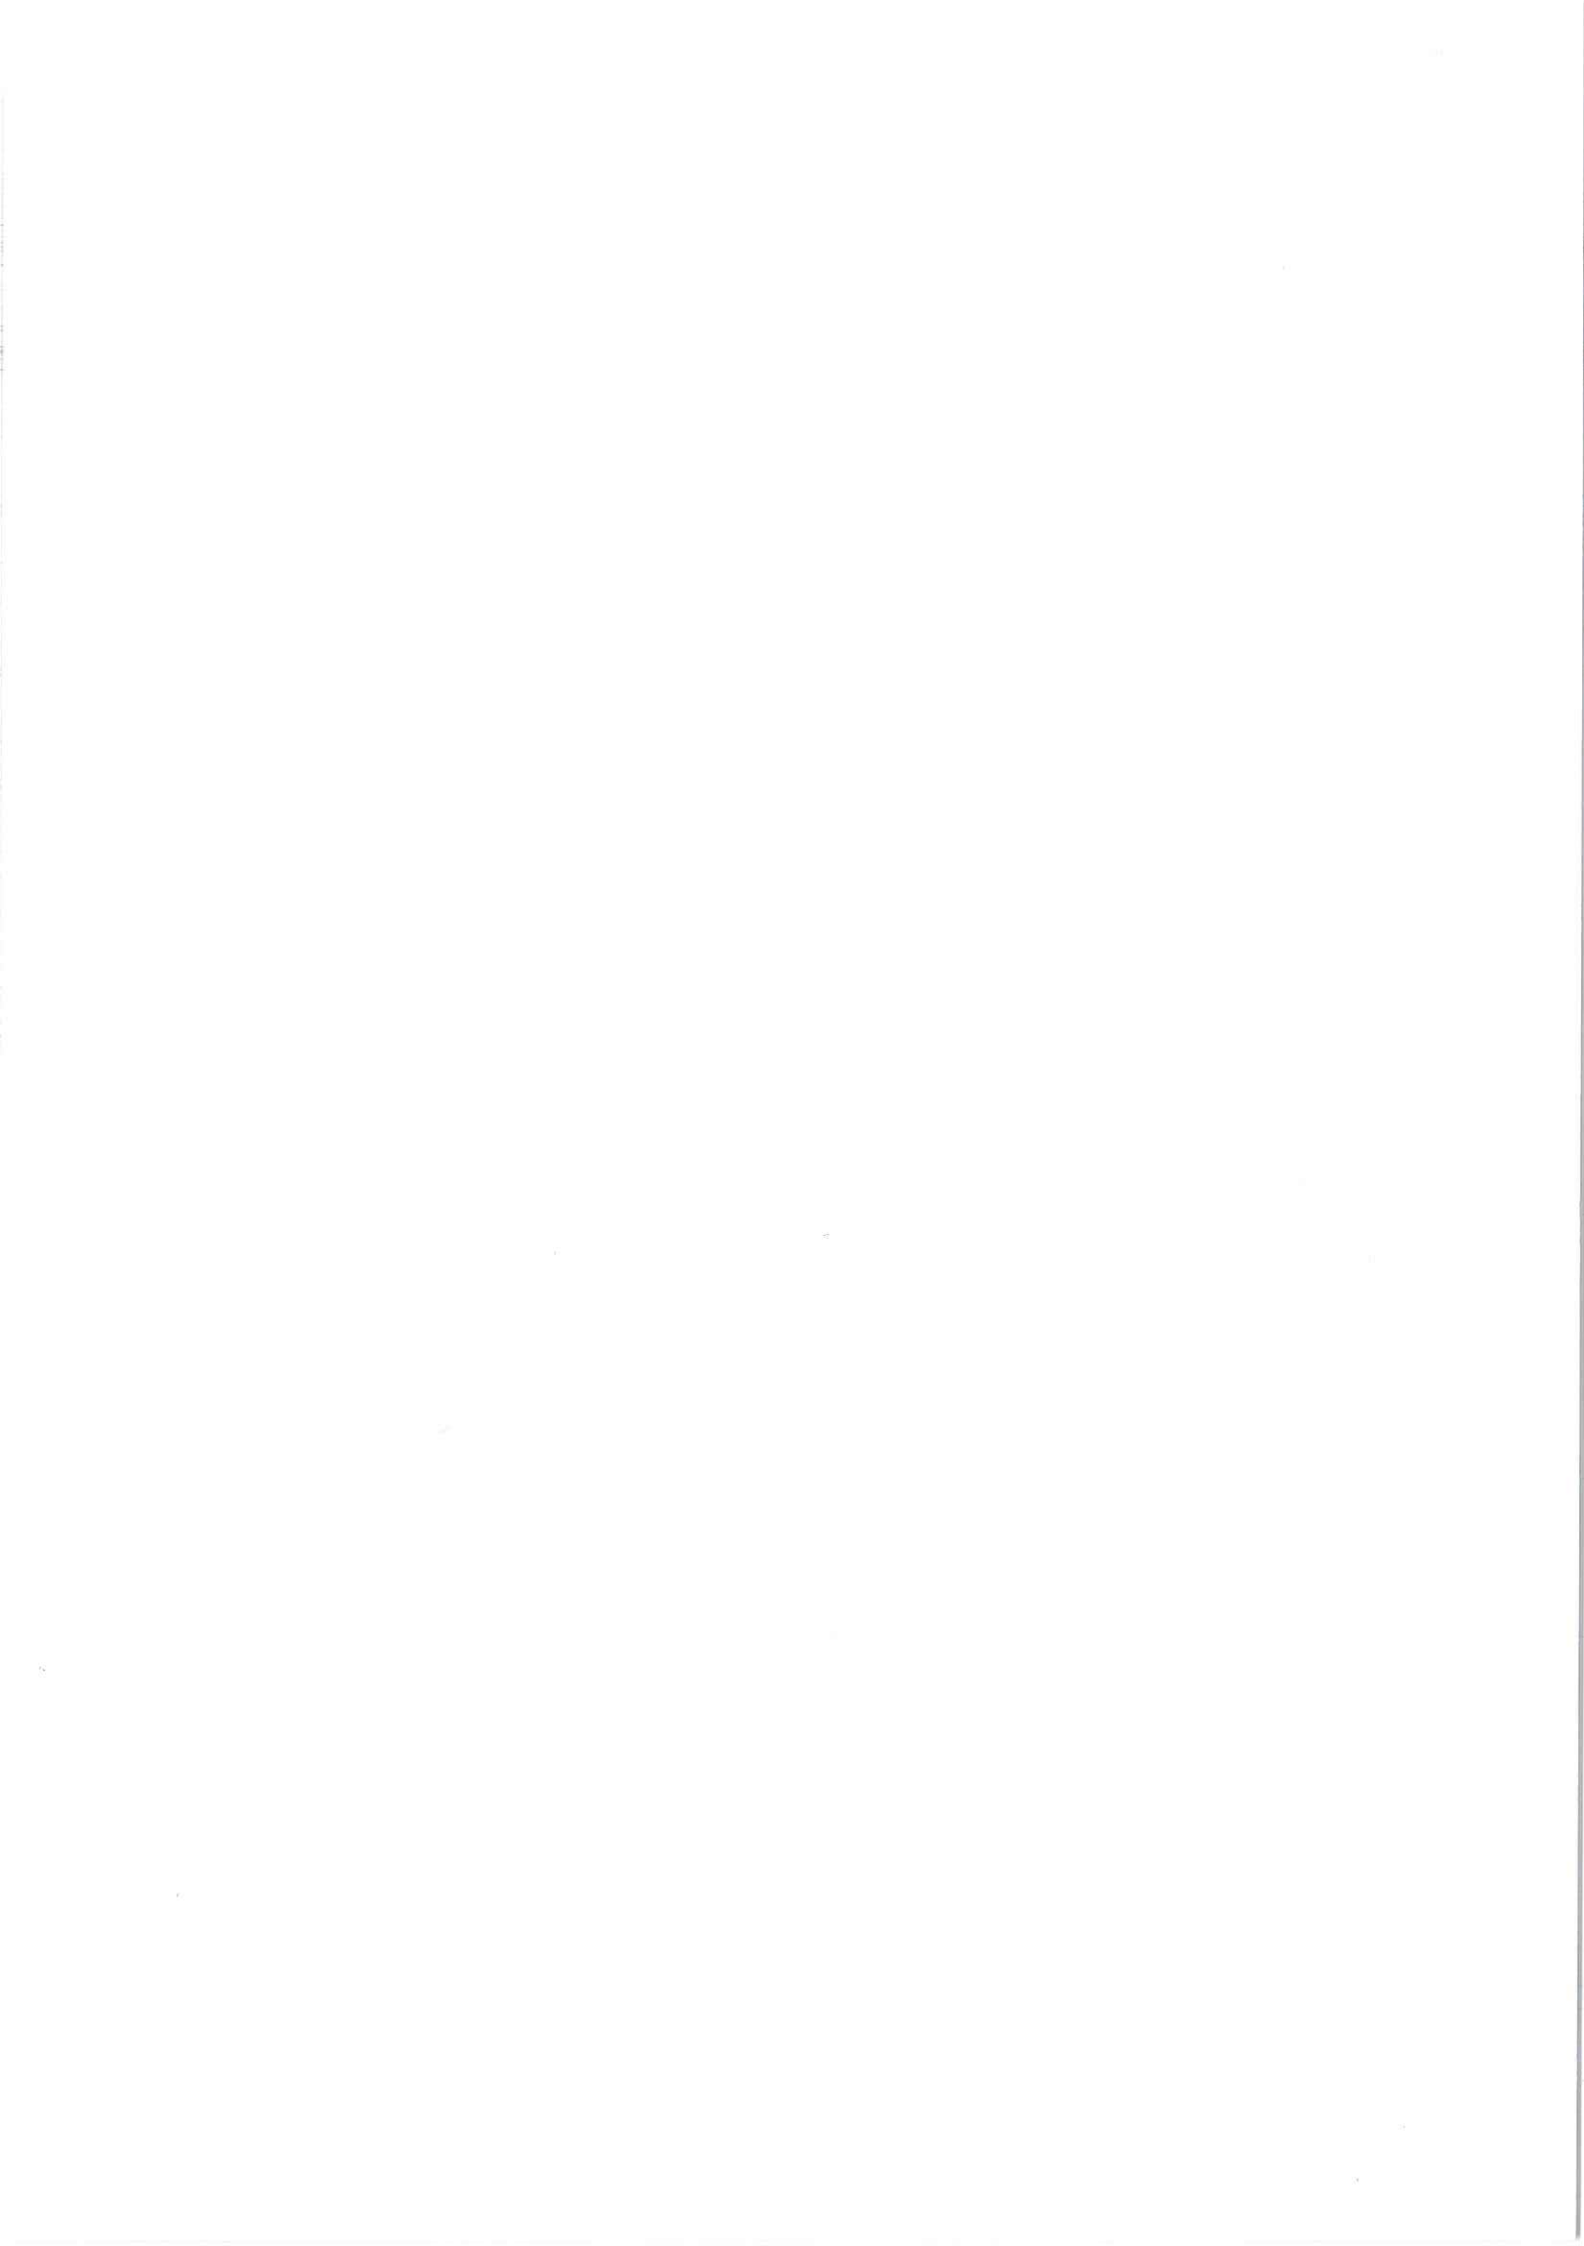

**Iktatószám:** IKT-2017-106-I1-00008651

**Kedvezményezett neve:** PILISSZENTIVÁN  
KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**Projekt címe:** Pilisszentiván Iskola és Hivatal  
épületének energetikai korszerűsítése

**Projekt azonosítószám:** KEHOP-5.2.9-16-  
2016-00103

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.**

Székhely: **2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730226**

Adószám/adóazonosító jel: **15730222-2-13**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**11742245-15390259-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Poppréné Révay Gyöngyi - polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.9-16-2016-00103** azonosító számon regisztrált, **2016.07.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.04.25.** napon kelt támogatási döntés



szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése**” című és **KEHOP-5.2.9-16-2016-00103** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85	1	
2084 Pilisszentiván, Szabadság u 85-87.	1	<b>Fő megvalósítási helyszín</b>

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

*Handwritten signature*

### **3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

#### **3.1. A Projekt kezdete**

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.06.19.**

#### **3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### **3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

##### **3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017.09.29.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

##### **3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2017.10.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

#### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **117 477 800 Ft**, azaz **száztizenhétmillió-négyszázhetvenhétezer-nyolcszáz forint**.

#### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **115 772 800 Ft**, azaz **száztizenötmillió-hétszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**



A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **115 772 800 Ft**, azaz **száztizenötmillió-hétszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **115 772 800 Ft**, azaz **száztizenötmillió-hétszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint**.

##### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **115 772 800 Ft**, azaz **száztizenötmillió-hétszázhetvenkétezer-nyolcszáz forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 ..... Kedvezményezett PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  P.H. Kelt ..... 2017 év ..... hónap ..... napján.	 ..... Támogató  Varró Ákos István főosztályvezető P.H. Kelt Budapest 2017 év ..... hónap ..... napján.
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

*Handwritten signature*



A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103

Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 627 647	5 569 465	26 197 112	1	26 197 112	26 197 112
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	41 167 937	11 115 343	52 283 280	1	52 283 280	52 283 280
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Beruházások kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	20 938 320	5 653 346	26 591 666	1	26 591 666	26 591 666
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	700 000	189 000	889 000	1	889 000	889 000
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	600 000	162 000	762 000	1	762 000	762 000



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	400 000	108 000	508 000	1	508 000	508 000
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 100 000	297 000	1 397 000	1	1 397 000	1 397 000
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	846 000	228 420	1 074 420	1	1 074 420	1 074 420
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	580 000	0	580 000	1	575 000	575 000



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 736 401	0	1 736 401	1	1 736 401	1 736 401
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatás díja	1 338 583	361 417	1 700 000	1	0	0
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatások költségei	945 000	255 150	1 200 150	1	1 200 150	1 200 150
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	236 000	63 720	299 720	1	299 720	299 720
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége vett szolgáltatásként	1 778 780	480 271	2 259 051	1	2 259 051	2 259 051



*[Handwritten signature]*

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
	k költségei			92 994 668	24 483 132	117 477 800		115 772 800	115 772 800
<b>Összesen:</b>									



*[Handwritten signature]*

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103

Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	115 772 800
Projekt elszámolható költsége	115 772 800
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	1 705 000
Projekt teljes költsége	117 477 800



### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103

Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.06.19.	Projekt előkészítése, kivitelezési dokumentáció elkészítése (engedélyek, tervek, közbeszerzés)	Elkészülnek a beruházás indításához szükséges engedélyek: - ELMŰ csatlakozási dokumentáció napelemhez villamos kiviteli - nyílászáró konszignáció - hőszigetelés műszaki beavatkozási terve e-napló - a munkaterület átadása	10 459 023
2	2017.07.30.	Napelemes rendszer elkészülte, átadása, szigeteléshez anyagbeszerzés, nyílászárók beszerzése	A pályázatban tervezett napelemes rendszer kiépül. Próbauzemet követően a kivitelező átadja, a megrendelő a műszaki ellenőrzést követően átveszi a napelemes rendszert, és az ahhoz tartozó dokumentációt (jegyzőkönyvek, garancialevél, minőségi tanúsítvány, kezelési-, karbantartási útmutató). A hőszigetelő anyagok és a nyílászárók beszerzésre kerülnek.	79 900 766
3	2017.09.29.	A projekt fizikai befejezése és zárása	Elkészül az épület hőszigetelése Megvalósul a nyílászárók cseréje Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás. A kivitelezési munkák befejezését követően elkészülnek a	25 413 011



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint számított meghatározott épületenergetikai tanúsítványa és a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számítások.	



*[Handwritten signature]*

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

**Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103**

**Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
  - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
  - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
  - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

**FIGYELEM!** Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!





## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103

Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.09.29.	477 180,0000	477 180,0000	477 180,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.09.29.	0	477 180,0000	477 180,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.09.29.	0	477 180,0000	477 180,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.09.29.	0	477 180,0000	477 180,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.09.29.	0	477 180,0000	477 180,0000
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.09.29.	0	477 180,0000	477 180,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.09.29.	183,6432	183,6432	183,6432
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.09.29.	0	183,6432	183,6432
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.09.29.	0	183,6432	183,6432
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.09.29.	0	183,6432	183,6432



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2021.09.29.	0	183,6432	183,6432
A megújuló energiaforrásból előállított energiamegnyiség (GJ/év)	2022.09.29.	0	183,6432	183,6432
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.09.29.	89,5700	89,5700	89,5700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.09.29.	0	89,5700	89,5700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.09.29.	0	89,5700	89,5700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.09.29.	0	89,5700	89,5700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.09.29.	0	89,5700	89,5700
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.09.29.	0	89,5700	89,5700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.09.29.	1 258,7400	1 258,7400	1 258,7400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.09.29.	0	1 258,7400	1 258,7400
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.09.29.	0,0468	0,0468	0,0468
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.09.29.	0	0,0468	0,0468
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.09.29.	0	0,0468	0,0468
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.09.29.	0	0,0468	0,0468
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.09.29.	0	0,0468	0,0468
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.09.29.	0	0,0468	0,0468



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00103

Projekt címe: Pilisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltétel es közbeszerzés	Meghirdet és tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés skötés tervezett/ tényleges dátuma
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Építés	-	95 052 200	95 052 200	Egyéb	-		/ 2016.07. 20.



*Handwritten signature and initials*

**2017. évre vonatkozó Likviditási terv**

Kedvezményezett neve:	Pillisszentiván Község Önkormányzata	
Projektazonosító:	KEHOP-5.2.9-16-2016-00103	
Projekt címe:	Pillisszentiván Iskola és Hivatal épületének energetikai korszerűsítése	
Utófinanszírozott tételekre Támogatási Szerződés szerint adható támogatási előleg összege:		115 772 800 Ft

<b>Támogatói előleg bevétel:</b>		
Kedvezményezett részére tárgyévet megelőzően kiutalt támogatási előleg összege		0 Ft
Kedvezményezett által elszámolt támogatási előleg összege*		0 Ft
Kedvezményezett által el nem számolt előleg összege*		0 Ft
Kedvezményezett által tárgyévben igényelt támogatási előleg összege**		115 772 800 Ft

<b>Tervezett támogatási előleg elszámolás összege tárgyévben:</b>		
1. Megnevezés***	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	4 630 420 Ft
2. Megnevezés	Közbeszerzés költségei	575 000 Ft
3. Megnevezés	Építéshez kapcsolódó költségek	105 072 058 Ft
4. Megnevezés	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 259 051 Ft
5. Megnevezés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítás	1 736 401 Ft
6. Megnevezés	Kötelezően előírt nyilvánosság költsége	299 720 Ft
7. Megnevezés	Egyéb szolgáltatási költségek	1 200 150 Ft
8. Megnevezés		
9. Megnevezés		
10. Megnevezés		
11. Megnevezés		
12. Megnevezés		
13. Megnevezés		
14. Megnevezés		
15. Megnevezés		
<b>Összesen:</b>		<b>115 772 800 Ft</b>

<b>Év végi tervezett egyenleg :</b>	<b>0 Ft</b>
-------------------------------------	-------------

\* Tárgyévet megelőzően kiutalt támogatási előlegből

\*\* Tárgyévben jelen likviditási terv időpontjáig igényelt és a tervet követően igényelni tervezett előleg összege

\*\*\* A Támogatási Szerződésben szereplő költségek megnevezései szerepeltek

Kérjük a likviditási terv mellékleteként lényegretörő, alátámasztó szöveges indoklás benyújtását! Kérjük a szöveges magyarázatban, a táblázatban szereplő számításokkal összhangban, részletesen bemutatni és alátámasztani az igényelt előleg mértékének és ütemezésének indokoltságát!

Kelt.:



törvényes képviselő  
Kedvezményezett neve

P. H.



